

ТЕКОВЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА


РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТ

| | |
|--|--|
| Име на проектот | Подобрена енергетска ефикасност во јавните објекти и намалување на загадувањето на животната средина во ЈЗГР |
| Носител на проектот | Центар за развој на Југозападен плански регион |
| Проектен партнер 1 | Општина Охрид |
| Проектен партнер 2 | Општина Кичево |
| Проектен партнер 3 | Општина Пласница |
| Проектен партнер 4 | Општина Дебар |
| Проектен партнер 5 | Општина Дебрца |
| Проектен партнер 6 | Општина Македонски Брод |
| <i>Доколку е потребно додате уште редови</i> | |
| Времетраење на проектот во месеци | 12 месеци |
| Датум на започнување на проектот (од денот на потпишување на договорот за финансирање на проектот) | 22.12.2021г |
| Вкупен буџет (денари) | 18.729.456 |
| Сопствено учество (денари) | 613.000 Партнер: Општина Кичево |
| Одобрени средства (денари) | 18.729.456 |
| Процент на одобрени средства во однос на бараните средства | 100% |

| | |
|--|--|
| <p>Остварени проектни цели согласно апликацијата</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Намалување на емисија на загадувачки материји (честички, CO₂, SO₂, NO_x) како еквивалент на CO₂ од согорување на фосилни горива (ЕЛ масло за ложење и дрва за горење) - Намалување на емисија на стаклени гасови - Намален ризик од заболување предизвикано од отпадни води и несанитарно одведен комунален отпад - Подобрен квалитет на живот на локалната заедница; |
| <p>Остварени проектни производи и резултати</p> | <p><u>Општина Пласница – Набавка на пластични контејнери за селектирање и собирање на отпад</u> – Набавка на пластични контејнери за селектирање и собирање на отпад со големина од 1100 литри – 59 парчиња; Набавка на пластични контејнери за селектирање и собирање на отпад со големина од 120 литри – 258 парчиња;</p> <p><u>Изведба на проектот за реновирање на објектите за одмор, опоравок и рекреација за лица со телесен инвалидитет во Охрид (ГО МОБИЛНОСТ)</u> - Сидане на сидови од гипскартонски табли – 9,5 м²; Молерисување на внатрешни сидови со поликolor во два слоја – 292,7 м²; Молерисување на внатрешни плафони во бањи со поликolor во два слоја – 42,1 м²; Хидроизолација на сидови во бањи – 230,1 м²; Набавка, транспорт и вградување на сидни керамички плочки во бањи – 210,1 м²; Набавка, транспорт и вградување на сидни керамички плочки во кујни – 21,4 м²; Набавка и вградување на еднокрилни метални влезни врати – 11 парчиња; Набавка и вградување на еднокрилни внатрешни врати од медијапан – 4 парчиња; Набавка и вградување на еднокрилни внатрешни врати од ПВЦ – 10 парчиња; Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ прозорци и врати – 28 прозорци и 5 врати; Мијалници -10 пар., батерии-10 пар., ВЦ шољи-10 пар., туш батерии-10 пар., огледала во тоалети-10 пар., ракофати за ВЦ шоља-20 пар, ракофати за туш-10 пар., специјално столче за туширање-10 пар.</p> <p><u>Изведба на проектот за доизградба на канал Песјак за прифаќање и одведување на атмосферски води и паралелно доизградба на фекална канализација во Општина Македонски Брод</u> - Рачен и машински ископ на земја – 112 + 168 м³; Набавка и вградување на слој од песок испод цевки – 80,0 м³; Набавка, транспорт и монтажа на полиетиленски канализациони цевки (PE ND 200, PE ND 800) – 200 м + 43 м; Набавка, транспорт и монтажа на арм. бетонски типски шахти Ф1000 со висина до 2м – 4 парчиња; Набавка, транспорт и монтажа на метални капаци – 4 парчиња; Изведба на куќен приклучок директно на цевка а просечна должина 6,0м со цевки ПЕ НД 160 – 8 приклучоци; Набавка, транспорт и вградување на бетон МБ30 за отворениот канал – Дно (30,8м³), Сидови (44,8 м³), и Влезен дел (5.166 м³); Набавка и поставување на двострана мрежеста арматура Q188 во дното и на сидовите – 3584 кг;</p> <p><u>Изведба на проектот за Доизградба на Дом во с.Требеништа во Општина Дебрца (втора фаза)</u> - Изработка на АБ плоча на терен, конструктивно армирана со мрежа Ф6/15/15 со д=10 цм – 55 м²; Изработка на рабацрана цемнтна кошулица со д=5-7цм – 80 м²; Бетонирање на тротоари околу објект д=10цм, со бетон МБ30, конструктивно армирана со мрежа Q188 – 40 м²; Бетонирање на АБ плоча кај тремот во приземје д=10цм, со бетон МБ30, конструктивно армирана со мрежа Q188 – 56,40 м²; Изведба на преграден сид д=12 цм, со дупла облога со гипс картонски табли на метална конструкција и исполнета со камена волна д=8цм – 18 м²; Малтерисување на внатрешни и надворешни сидови со цементен малтер во два слоја – 223,6 м²; Набавка и обложување со гипскартонски табли д=1,25цм на сите внатрешни сидови – 1062 м²; Изработка на фасада- со стиропор 5цм, лепак, мрежа и декоративен малтер – 430 м²; Обработка на дрвени стреви од кров со стиродур – 92 м¹; Изработка на таван со гипс картонски плочи на метална констрк. – 280 м²; Изработка и монтажа на внатрешни врати – 13 парчиња; Изработка на хоризонтални и вертикални олуци, солбанки и опшивки – 110+51,5+30 м¹; Молерисување на сидови и тавани – 1621,5 м¹; Обложување на сидови со сидни керамички плочки, подни плочки, под на тераса – 60,32 + 16 + 280 + 22 м²; Набавка и монтажа на ламинат со д=8мм – 200 м²; Набавка и монтажа на умивалници (5 пар.), батерии (5), ВЦ шољи (4), огледала (4), држачи (4)</p> |

| | |
|---|---|
| <p>Реализирани активности</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Кордибирање и менаџирање на проектот (за општина Пласница, Охрид, Македонски Брод и Дебрца) 2. Избор на консултанти за техничка спецификација и евалуација на понудите (за сите објекти) 3. Тендерски постапки (Охрид, Пласница, Дебрца и Македонски Брод) 4. Избор на надзорни органи (За сите објекти е обезбеден надзорен орган) 5. Изведба на проектот за реновирање на објектите за одмор, опоравка и рекреација за лица со телесен инвалидитет во Охрид (ГО МОБИЛНОСТ); 7. Изведба на проектот за Набавка на садови за собирање и селектирање на отпад во општина Пласница 9. Изведба на проектот за Доизградба на Дом во с.Требеништа- втора фаза, Општина Дебрца 10. Изведба на проектот за доизградба на канал Песјак за прифаќање и одведување на атмосферски води и паралелно доизградба на фекална канализација во Општина Македонски Брод 11. Извештаи од надзорен орган (Општина Охрид, Дебрца, Македонски Брод) 12. Пуштање во употреба на објектите (Набавените количини на контејнери им се предадени на општина Пласница; апартманите се предадени на ГО МОБИЛНОСТ-Охрид; новата фекална и атмосферска канализација пуштено во употреба во Мак.Брод; реконструираниот Дом на култура е предаден на користење на општина Дебрца) |
| <p>Активности кои не се реализирани</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Кордибирање и менаџирање на проектот (за другите објекти) 3. Тендерски постапки (Дебар и Кичево) 6. Изведба на проектот за Енергетска ефикасност и реконструкција на ОУ „Фаик Коница“, подрачно училиште во село Бачишта, Општина Кичево 8. Изведба на проектот за енергетска ефикасност на ПП објектот во Дебар 11. Извештаи од надзорен орган (за другите објекти) 12. Пуштање во употреба на објектите (другите објекти) |
| <p>Функционалност на објектот Само за инфраструктурни проекти</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Општина Охрид – Реконструкција на апартманите на ГО Мобилност</u> – Апартманите на ГО Мобилност наменети за одмор, опоравка и рекреација за лица со телесен инавалдитет се целосно реконструирани со нови прозорци и врати од ПВЦ, реновирање на бањите со нови сидни плочки и хидроизолација, нови керамички плочки во кујнит е, молерисување на сидовите, елементи за бањите- мијалници, батерии, ВЦ шољи, ракофхати за туш, огледала, ракофхати за ВЦ, столчиња за туширање. 2. <u>Општина Македонски Брод – Доизградба на канал Песјак</u> – Новата мрежа на фекална и атмосферска канализација е изградена со бетонски армирана плоча и канализациони цевки. Вкупната должина на каналот е околу 213 м. Исто така се монтирани и 4 нови шахти, приклучени се 8 куќи во канализацијата. 3. <u>Општина Дебрца – Реконструкција на Дом во с.Требеништа</u> – Зградата е целосно реконструирана и може да се стави во употреба како културно-историски дом на општината. Од надворешната страна зградата има нова термо фасада, додека внатре во објектот се реконструирани сите сидови и тавани и подови, нови внатрешни врати врати, реконструкција на тоалети. |

| | |
|---|--|
| <p>Остварување на намената на објектот</p> <p>Само за инфраструктурни проекти</p> | <p>1. Со реконструкцијата во апартаментите на ГО Мобилност во Охрид, се очекува да се намалат топлинските загуби во самите објекти, исто така и се подобрени условите за престој на над 8000 членови на ГО Мобилност.</p> <p>2. Со доизградбата на каналот Песјак во Општина Македонски Брод, населбата и околните куќи ќе имаат подобри услови во насока на третирање и собирање на фекалната канализација и атмосферска канализација. Со тоа се овозможува заштита на почвата од фекалии како и заштита од можни поплави.</p> <p>3. Со реконструкцијата на културно-историскиот дом во с.Требеништа, општината и граѓаните и туристите добиваат нов и реновиран дом, се подобруваат условите за работа во објектот и се намалуваат загубите на топлинска енергија.</p> |
| <p>Фотографии</p> | <p>1. Изведба на проектот за <i>Набавка на садови за собирање и селектирање на отпад во општина Пласница</i></p>  <p>2. Изведба на проектот за <i>реновирање на објектите за одмор, опоравка и рекреација за лица со телесен инвалидитет во Охрид (ГО МОБИЛНОСТ);</i></p>  <p>3. Доизградба на канал Песјак во Македонски Брод</p> |

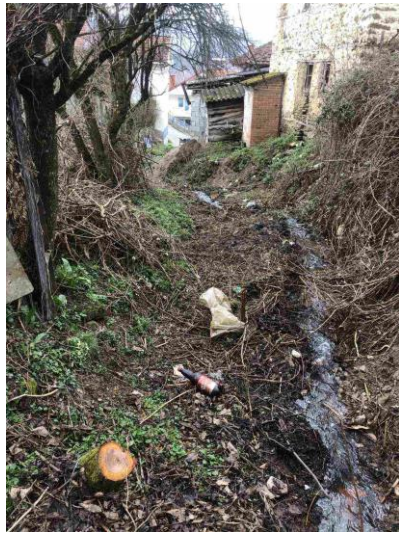

4. Изведба на проектот за Доизградба на Дом во с.Требеништа – Општина Дебрица



Центар за развој на Југозападен плански регион
Директор:
м-р Мирјана Лозаноска

Изработил:

Валон Каба
Регионален координатор
